ダンプ荷台へ昇降中、足を踏み外して墜落

墜落転落ー11

災害発生時記録							
発生月日　時	8月28日（水）　15時50分			工事内容	河川工事～河道堀削・運搬・整地　工事用道路補修　除雪工		
被災者	職種	運転手	経験年 41	所属	元請　直営　2次会社　1人親方　請負外契約	初期の対策状況含む事項(写真含)	
被災程度	右側頭骨及び右肩甲骨の骨折						
災害発生状況（写真）	被災者は、土砂積込箇所で待機中のダンプトラックのプロテクター上のたたんだシートが緩み広がっていたために 固定しようとキャビン横のハシゴを昇り荷台に乗り移る際に足を踏み外し墜落した。					右側頭骨及び右肩甲骨骨折により、通院休業60日	

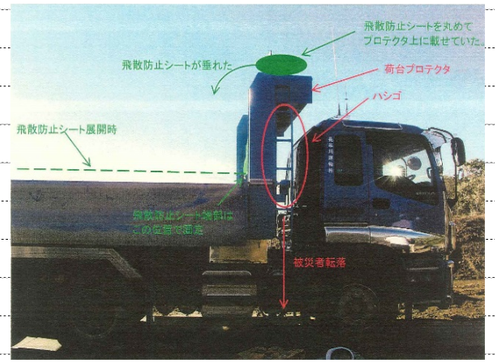

番号	災害発生要因	人的要因	物的要因	管理的要因	同種工事の再発防止対策	コメント(追記・確認すべき事項)
1	慣れた行為であり足元の確認を怠った。	◎		○	KY活動で昇降の際の足元注意を確認する	荷台のシート掛けは専用の足場設備を設け、 専属の作業員が行っていた。

調査記入時の注意点ーー①　所属欄は5項目の該当する項目に○マークの記入　　②3要因(人的･物的･管理的)に関係･該当する要因に○ー重要要因と思われる事項に◎を記入してください。(添付要因資料参照)
