足を踏み外し転倒した際にアンカーボルトに強打

転倒ー6

災害発生時記録						
発生月日　時	8月25日（火）14時50分		工事内容	集成材木建工事		
被災者	職種	大工	経験年	24	所属	三次下請け
被災程度	左大腿部打撲挫傷					

災害発生状況（写真）

ローリング足場上の資材を下す際、段差部分に足を踏み外し転倒し、飛び出でいたアンカーボルトに大腿を強打し負傷した。

踏み外した左足

ぶつかったアンカー

初期の対策状況含む事項(写真含)

作業通路側を立ち入り禁止囲いと標示を行い、足場上よりロープにて荷を降ろした。

ロープ及び表示による通路側の立入禁止

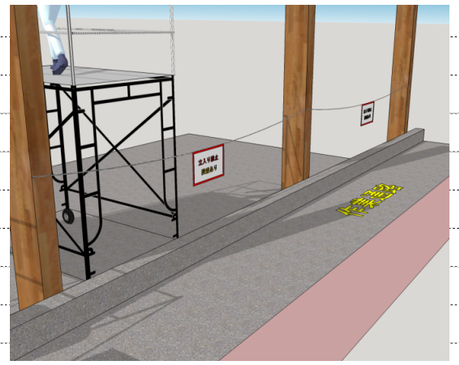

ロープを使用しての荷降ろし

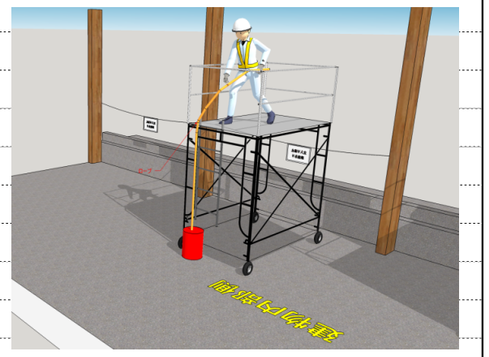

番号	災害発生要因	人的要因	物的要因	管理的要因	同種工事の再発防止対策	コメント(追記・確認すべき事項)
1	両手で資材を持っていたため、バランスを崩した際に体を支えることが出来なかったこと	◎			足場から資材等を下す場合は二人で行う。若しくはロープ等を使用し安全な態勢で行う	通路として使用する部分の凸凹、段差などは改善し誰でも安全に歩行できるよう管理すること。
2	足元が段差となっていたこと。		○		段差となっている面を立入禁止とした。	
3	アンカーボルトが養生されていなかったこと。			○	ボルト先端に養生キャップを取り付ける。	

調査記入時の注意点ーー①　所属欄は5項目の該当する項目に○マークの記入　　②3要因(人的･物的･管理的)に関係･該当する要因に○ー重要要因と思われる事項に◎を記入してください。(添付要因資料参照)
