型枠解体中、型枠とコンクリートに指を挟まれる

挟まれ巻込まれー６

災害発生時記録							
発生月日　時	10月　5日			工事内容	消波ブロック製作		
被災者	職種	普通作業員	経験年	1	所属	元請　(直営)　次会社　１人親方　請負外契約	初期の対策状況含む事項(写真含)
被災程度		右手第4.5指　挫創　第4指基節骨骨折　休業2日					

災害発生状況（写真）

クレーンを用いて消波ブロックの型枠を解体中、型枠の下部が打設用ﾍﾞｰｽｺﾝｸﾘｰﾄの端に引っ掛かった
ため合図者がクレーンを停止させようとした時、被災者が型枠に手を掛け、揺さぶったため引っかかってる部分
が外れ、その反動で型枠が振れブロックと型枠の間に指を挟み負傷した。

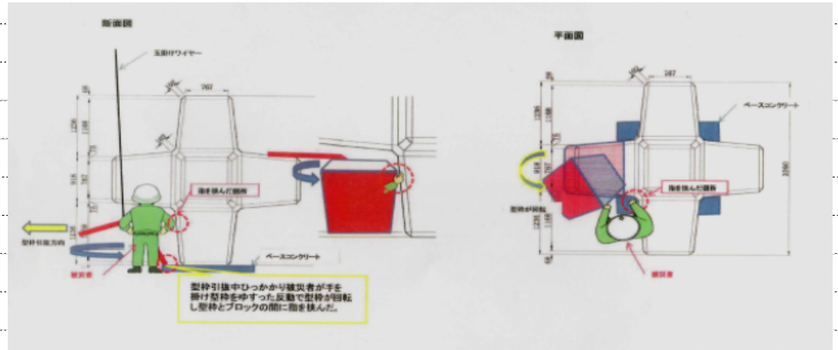

初期の対策状況含む事項(写真含)

想定外の事態が生じた場合、個人で処理するのではなく担当職員に報告し、指示を受ける
ワイヤーを掛け直し、引き出す。

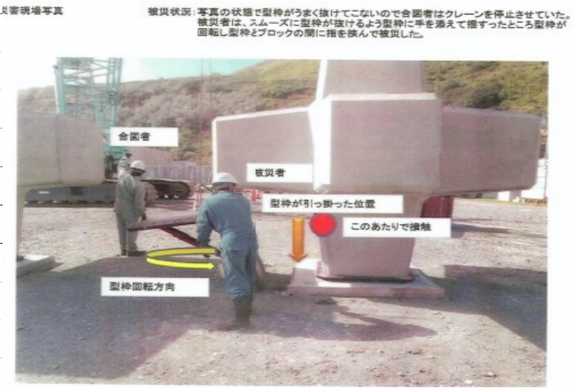

番号	災害発生要因	人的要因	物的要因	管理的要因	同種工事の再発防止対策	コメント(追記・確認すべき事項)
1	指示もなく勝手に型枠を揺さぶったこと。	○		◎	作業合図の徹底をKY活動などで確認する。	玉掛け作業は簡単そうで誰にも出来そうに思いますが実際は熟練が必要な作業です。経験の浅い人が作業に携わる場合は、熟練者による指導が重要であり、作業前に十分に打ち合わせを行うことが重要です。
2	不安定なつり荷に手を掛けたこと。	○		○	つり荷が安定するまで近づかないよう、KY活動などで確認する。 つり荷やワイヤーが引っ掛かるなどの不具合が発生した場合の手順を定めた。	

調査記入時の注意点ーー①　所属欄は5項目の該当する項目に○マークの記入　　②3要因(人的･物的･管理的)に関係･該当する要因に○ー重要要因と思われる事項に◎を記入してください。(添付要因資料参照)
