


# 新型コロナウイルス感染症の 感染防止対策に伴うアンケート結果

令和2年3月30日時点の状況

(回答期間:3月9日～3月30日／回答件数:298件)

# Q1 感染拡大を受けて講じている対策

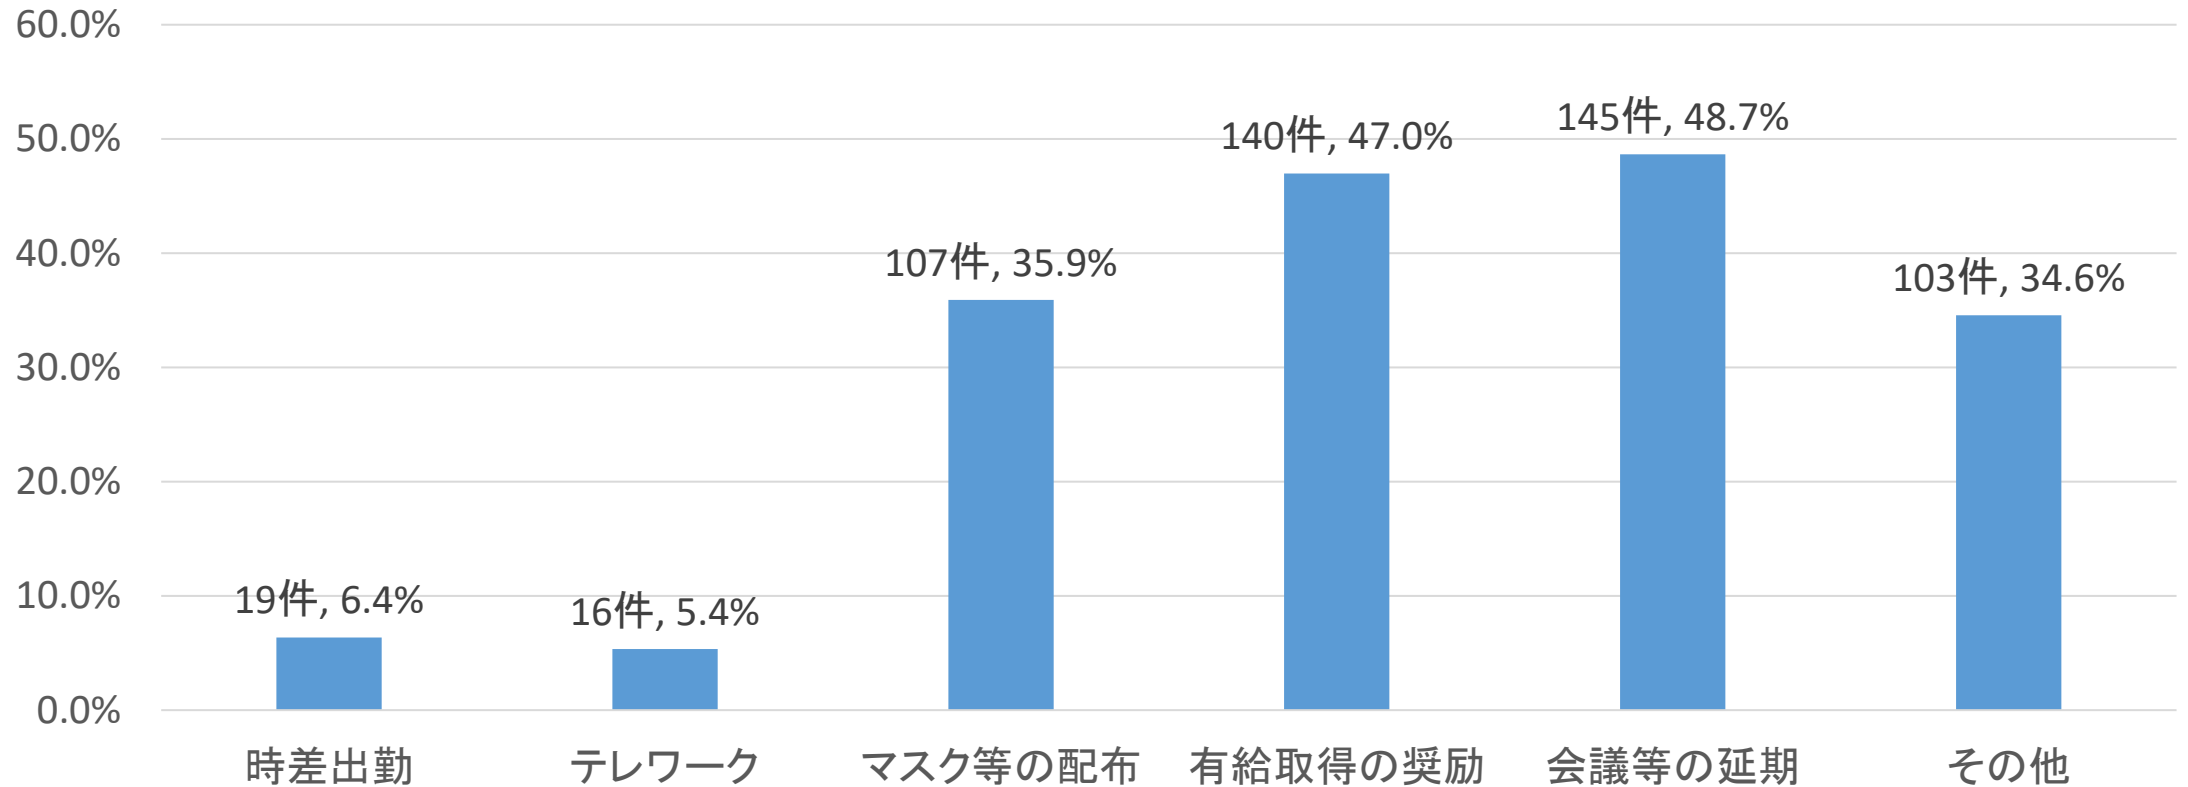

# Q1 感染拡大を受けて講じている対策(その他)

- ・各現場への消毒液の配布及び手洗いの徹底
- ・外出と出張の制限、社員の健康状態の把握
- ・ハンドタオル、パンフレットの配布（マスク、消毒用品は入手困難）
- ・各玄関及び部屋出入口消毒液配置、加湿消毒機配置
- ・朝礼を一時廃止・トイレの手拭きを布タオルからペーパータオルへ変更・玄関口等にアルコール消毒液設置
- ・基本的生活習慣の徹底、かからない・うつさない(マスク着用・うがい・手洗い・検温等)
- ・不要不急の出張を禁ずる ・出勤時に体温の測定
- ・3月19日まで自宅待機(工事部)
- ・共働き等の家族による 学校閉鎖による子供の面倒による自宅待機

# Q1 感染拡大を受けて講じている対策(その他)

- ・コロナウィルスに関する情報の回覧 ・特別休暇 ・社内除菌機能の充実
- ・本社営業時間の短縮 ・公共交通機関利用の従業員に一時特別休暇付与
- ・一部の現場等において職員・作業員・運転手・下請を自宅待機(給料補償)実施
- ・感染拡大防止に対する対応の通知を出状、周知徹底
- ・発熱時等の自宅待機(特別休暇)、休校措置による保護者等への特別休暇
- ・うがい・手洗い・マスク等基本動作の徹底励行 ・消毒液を現場に配布
- ・社屋立入り時の手指の消毒 ・社内、現場にアルコール消毒液の設置
- ・有休が無くなった場合でも欠勤による給与からの控除をしない
- ・新型コロナウイルス対策ガイドライン作成 ・健康状態の把握(検温等)
- ・会合や集会参加への自粛 ・栄養と睡眠を十分にとって、免疫を高めるように指導した。

# Q1 感染拡大を受けて講じている対策(その他)

- ・子連れ出勤の受け入れ。 ・不要不急の行事(外勤)の自粛 ・体温計の配置
- ・事務所内の消毒 ・朝晩の検温実施・報告、出張の取りやめ、インターネット会議の実施
- ・自家用車通勤 ・安全大会の中止
- ・毎朝の検温(異常があれば保健所の指示に従い、結果が出るまで部署の臨時休業)
- ・営業拠点の一時閉鎖
- ・支店・従業員の子育て支援として同伴出勤許可、会社方針を策定して日常行動の自粛よびかけ
- ・消毒液の設置、マスクの利用促進、熱がある場合の報告・自宅待機等の指示等
- ・入社式の縮小開催
- ・歓送迎会、親睦会の自粛


## Q2 施工中の工事への影響



## Q2 施工中の工事への影響


- ・子育て世代従業員について休暇を取らせているので現場にも多少の影響がある。
- ・資材の納入時期遅延 ・資材の遅延 ・愛別在住の方が念のためお休みしている。
- ・マスクやアルコール消毒液が不足している ・材料の納期遅れによる工事の遅れ
- ・民間住宅設計担当者が風邪をひき、例年なら無理して出勤してくるところを強制的に休ませることで、設計業務に滞りが出ている。
- ・工程が2～3日程度遅れをとっている状態である。 ・建設資材の納入遅れ
- ・中国での生産品の納期の遅延及び未定など ・民間病院の改修工事の中断
- ・建築資材の入荷が物により遅れ気味となっている
- ・中国での生産品の部材等の納期の遅延等が懸念される。
- ・一部工事に中断期間が生じた。

# Q3 施工中の工事の中止希望

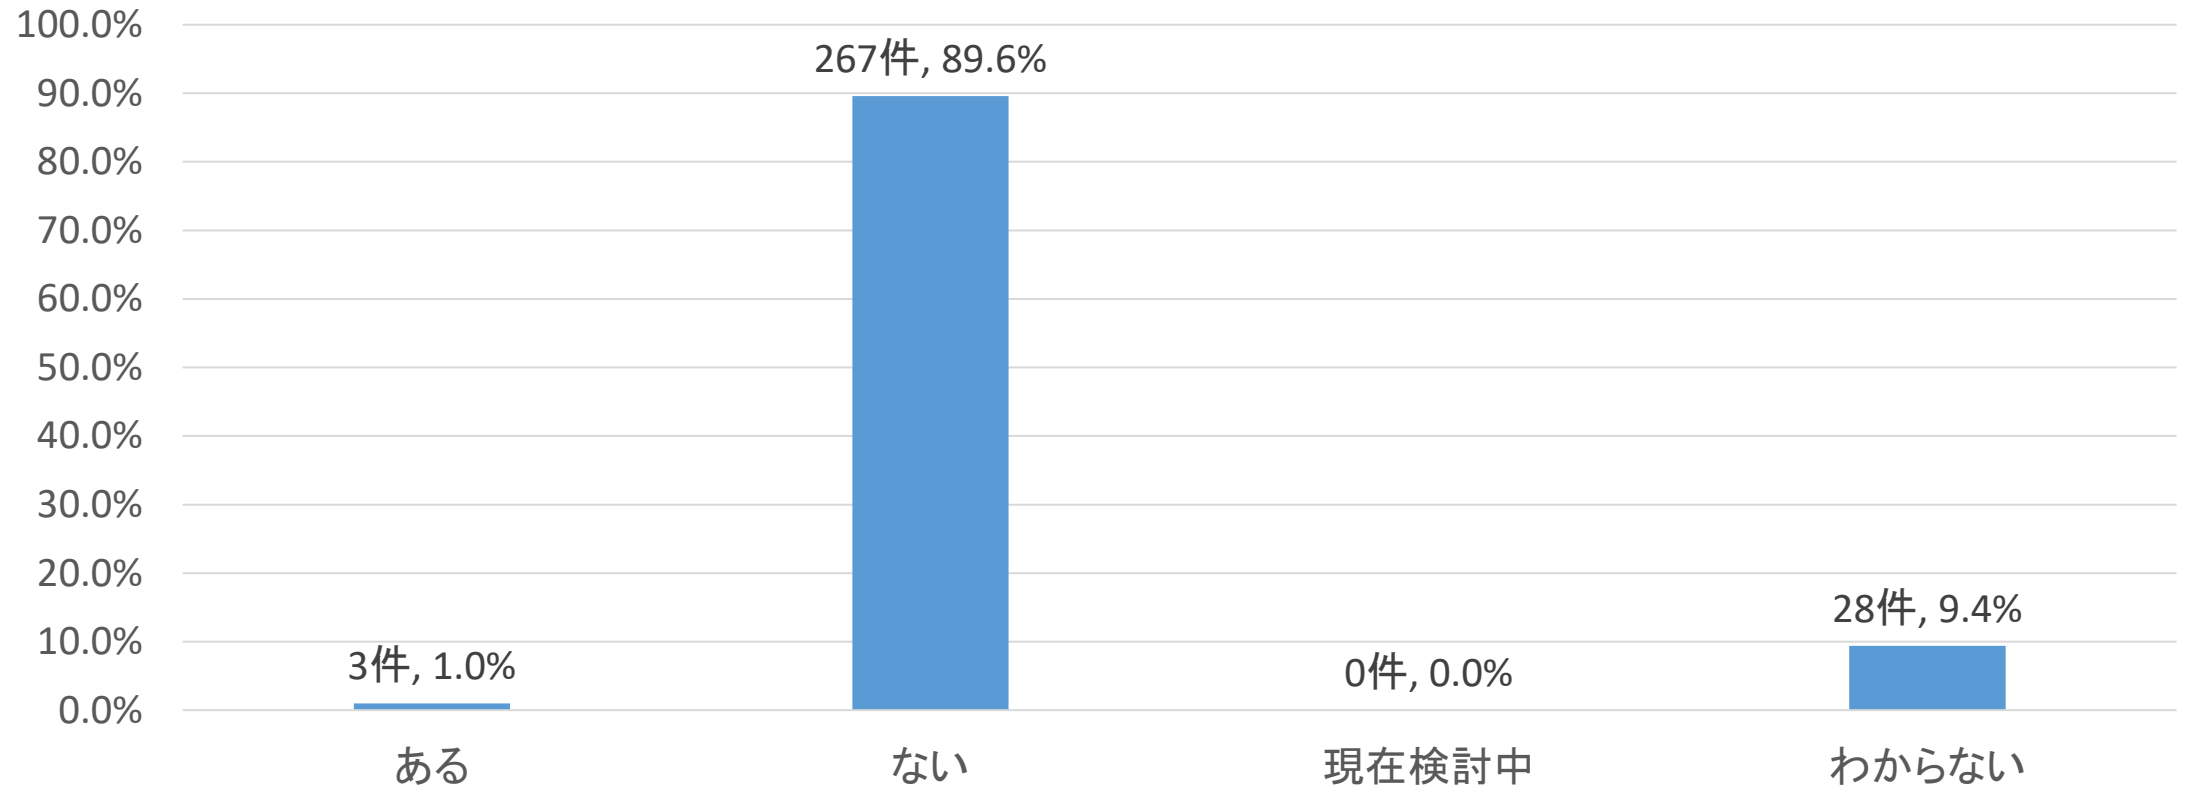




# Q4 資機材企業や協力企業への影響

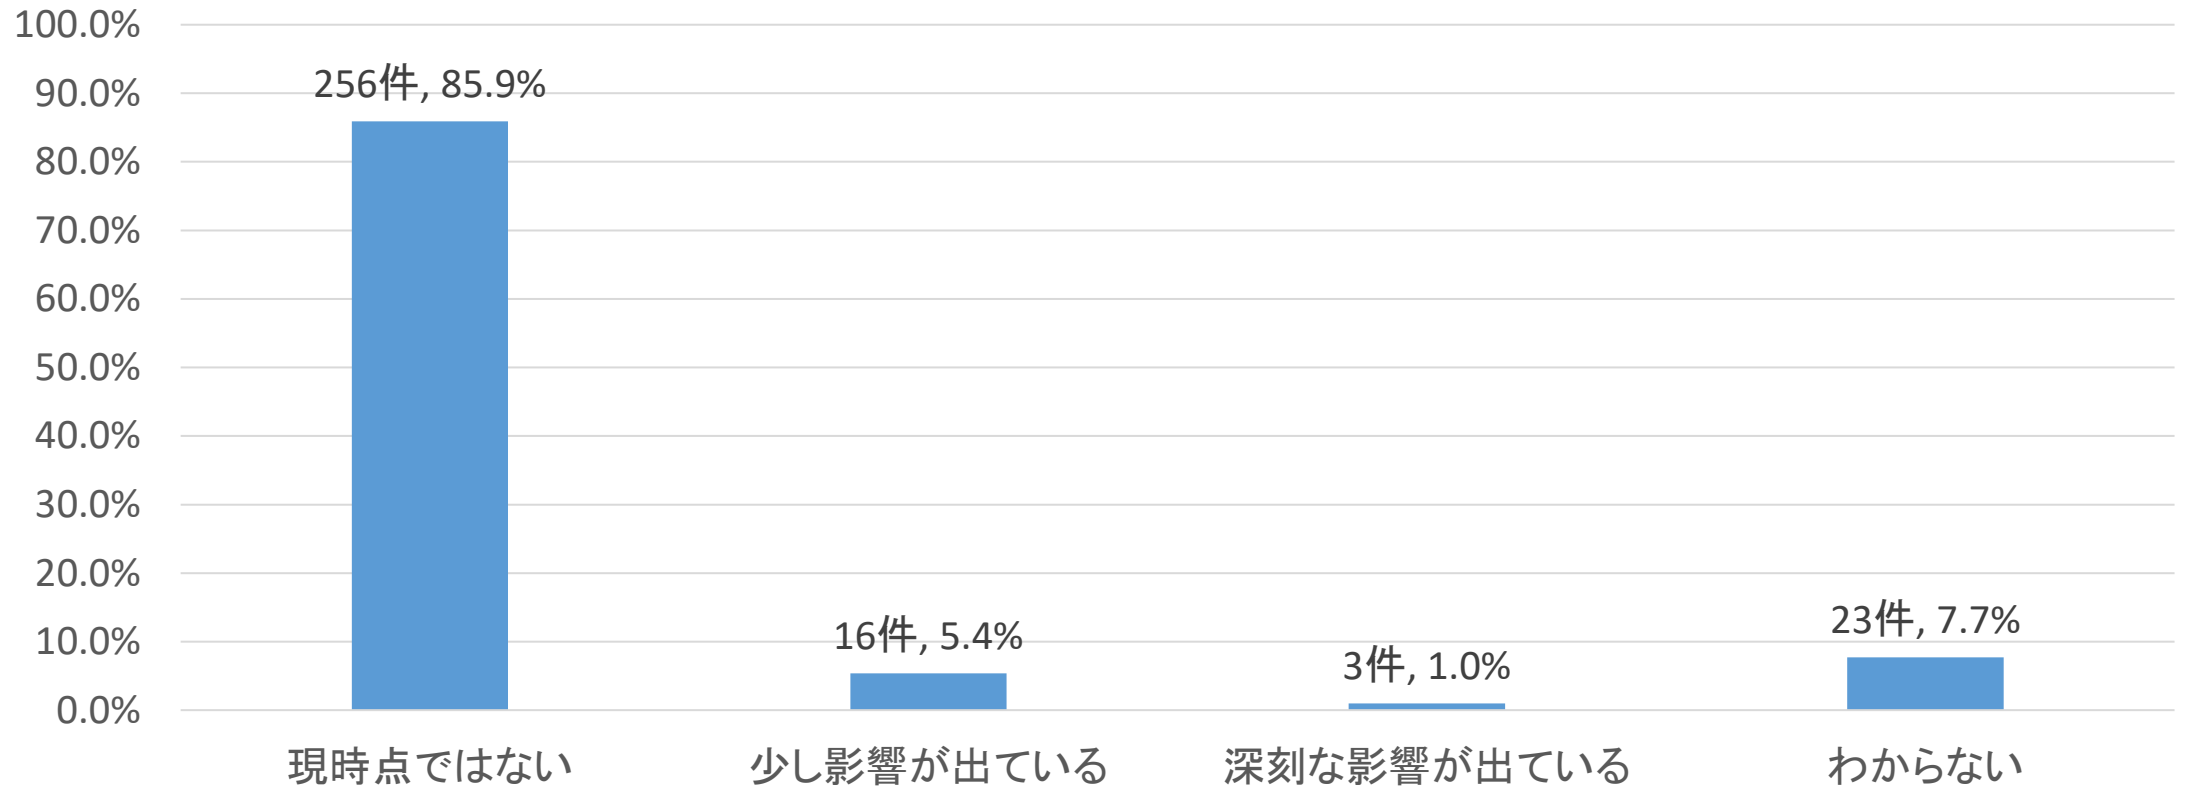

## Q4 資機材企業や協力企業への影響

- ・水回り品の入荷未定 ・工期の問題 ・衛生資機材の受注停止
- ・中国で生産されている資材が入らない ・各メーカーからのオーダーストップ
- ・設備等の部品供給が滞っているため納品が遅れる。又は受注停止(メーカー)
- ・一部資材・機材の制限が出るだろう事を通達されている ・建築資材が納入できない
- ・営業自粛による訪問回数や打ち合わせ機会の減少 ・物品の未納など
- ・民間改修工事でトイレ、ユニットバスの部品供給(中国からの)の遅延で納入が遅れることが予告されている。
- ・納期の遅れ、注文受付停止の発生 ・便器、IHヒーターの一部で輸入部品の調達遅れ
- ・工場製作品の納品が遅れている ・作業の中断を希望する協力会社がある
- ・電気工事等では中国製品の遅れによる工程遅延の影響が出ている。


# Q5 資機材の納期への影響

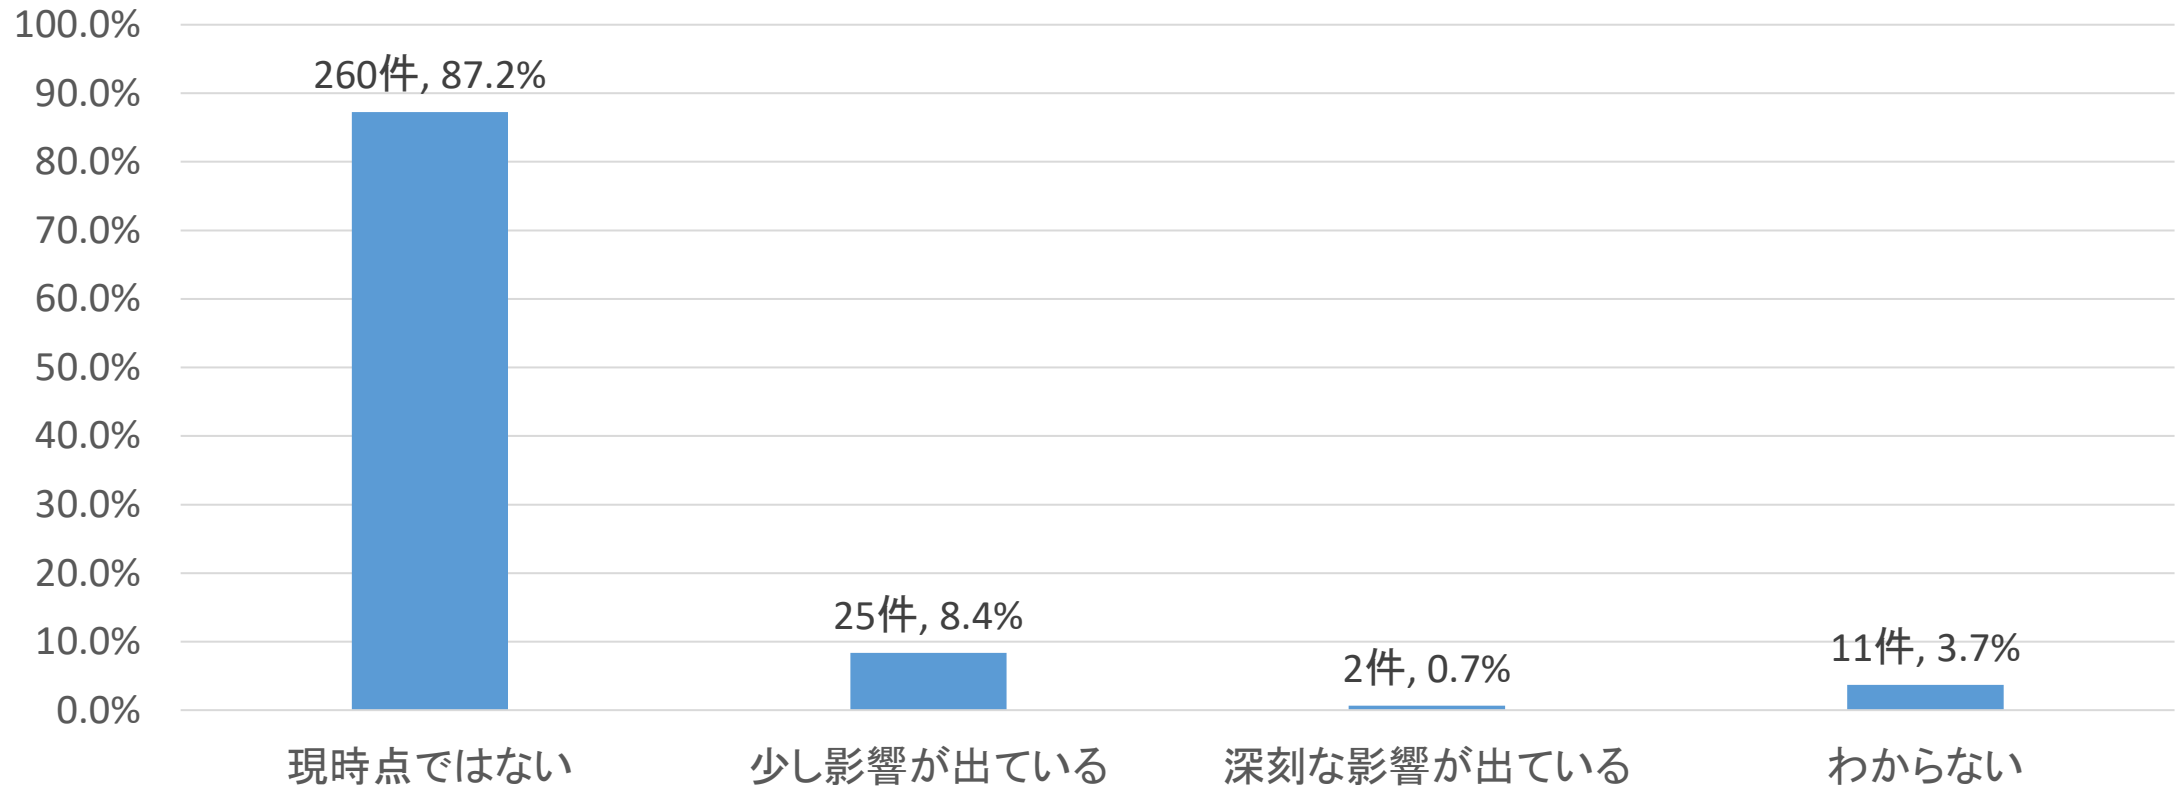

## Q5 資機の納期への影響

- ・中国製が多いため、住宅機器が納入されない。(納入が遅れる)
- ・今後の仮設用資材に関しては、入荷遅れ在庫不足の可能性ありとの連絡が一部業者から来ている
- ・建設資材の納期遅れ ・物品の遅延や納期未定 ・便器、IHヒーターの納期が未確定
- ・工場製作品の納品が遅れている(トイレ関係など) ・一部資材の納期遅れ・生産不能
- ・設備什器の納期がわからない ・中国製の建築資材の不足(便器、ユニットバス等)
- ・今後ユニットバス等の中国の生産品の遅れ、受注を見合わすものも出てきている。
- ・衛生器具、タイル・石等工事施工に必要な材料の納期が遅れる可能性が懸念される。
- ・便器、メラミン化粧板、タイルや石等の入荷の目処が立たない。
- ・トイレ、キッチン、ユニットバスなど住宅設備の調達の遅れ。

## Q6 影響があった場合に発注者へ求める対応

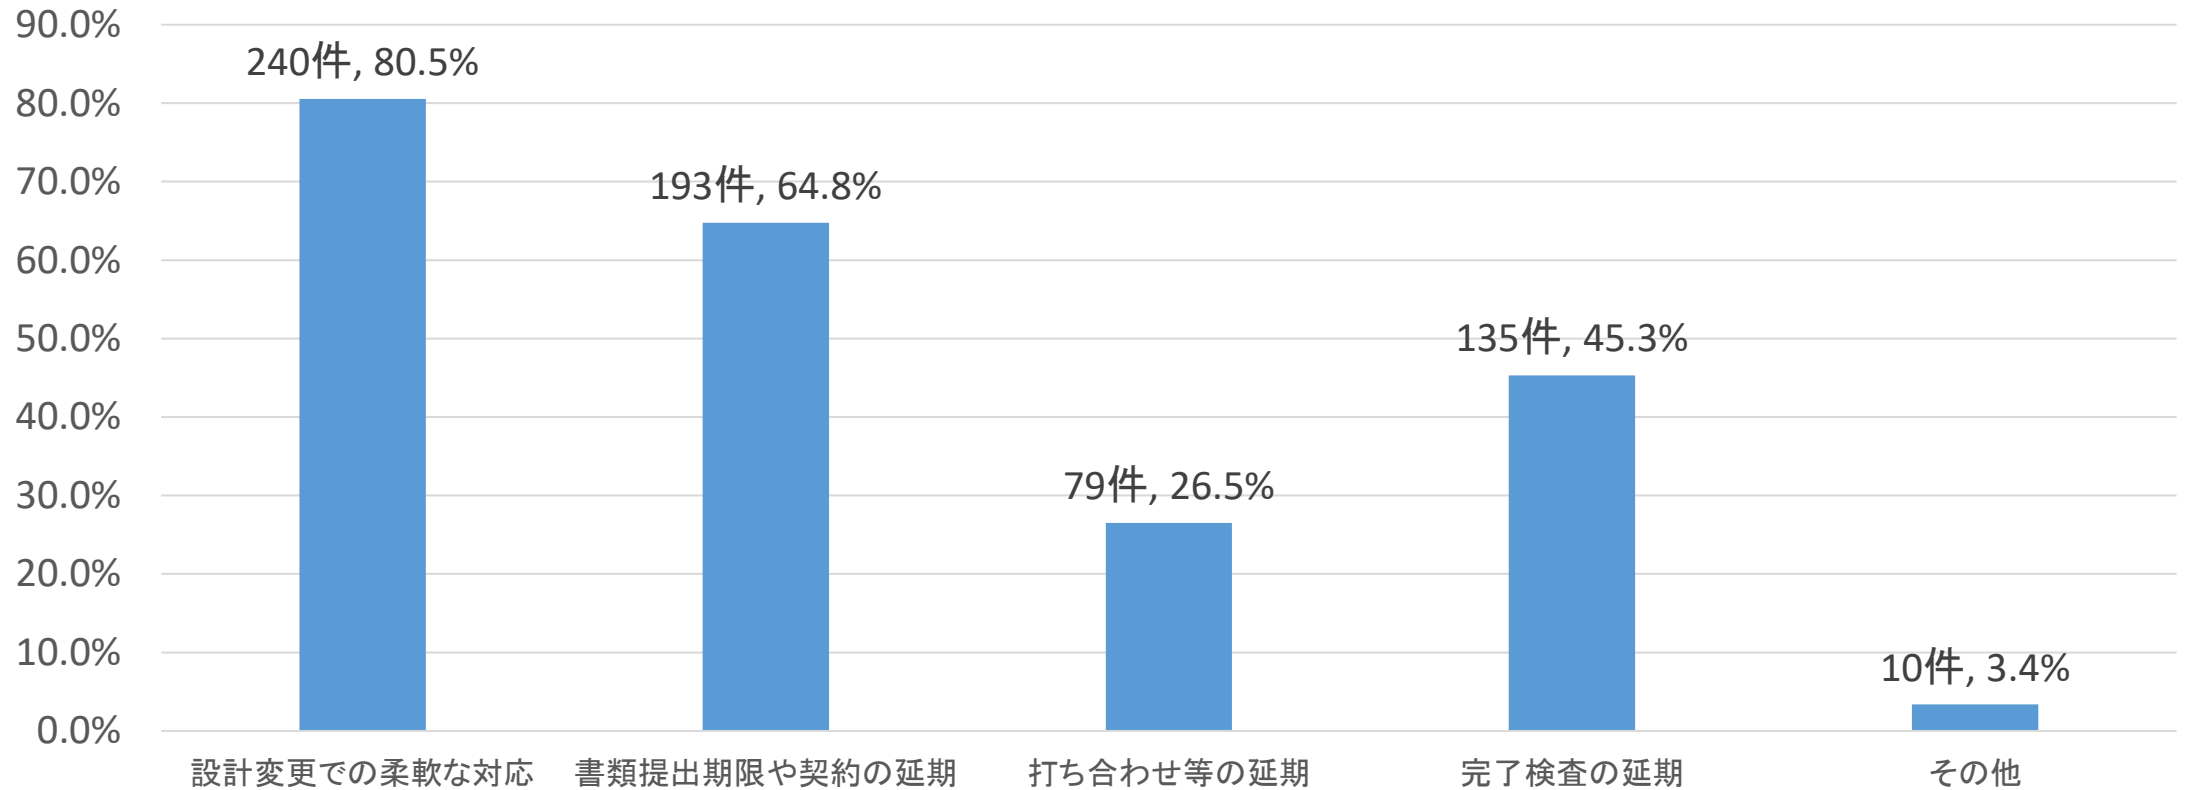

## Q7 その他・意見

- ・できるだけ具体的に必要とする物の納入時期を明確にしてほしい
- ・研修会など中止によるCPDS取得が困難となっており、入札条件の緩和をお願いしたい。
- ・これを機会にVRやARでの現場検査実施など遠隔地での現場管理の効率化を議論し進めてほしい。
- ・現場に関しては竣工間近の現場が多数ある状態である。ただ、濃い内容の工程は終了しており、後片付け工や手直し・補修等の作業が多い状態です。次年度以降、マスク・アルコール消毒液を現場事務所に常備したいと考えていますが、品物不足で非実現的である。
- ・現場がもうすぐ終了で、役所と順次対応しながら進んでいるので、大丈夫です。
- ・工事を中止せざるを得ない場合には、費用をどのように補填するか(金額なども)具体的に明示してもらいたい。全道の感染者がどの「区域」で発生しているか、「行動範囲」などを情報公開してほしい。特に注意すべきことを理解でき、外出を控えることや日々の行動に反映できる。
- ・現時点では閑散期でもある為、大きな影響はないですが今後長期化する場合は資材納期、人員確保、感染対策費等大きな負担となる可能性を感じています。

## Q7 その他・意見

- ・影響の基準(資材不足、人員不足、工期延長、支払い)等を行政がどの様に対応(保障、補助)してくれるか。いつまで対応してくれるか。
- ・コロナウィルスで心配になるのは分かるが、あまり自粛ムードが強くなりすぎるのは如何なものかと思う。経済活動も重要な要素であるため、過度な反応は控えていく方向性になってほしいと思う。
- ・早めの情報提供並びに情報の開示をお願いします。
- ・発注者には、柔軟な対応をお願いしたい。資機材については今後の動向を見極めながら、状況に応じた対応が可能になるようお願いしたい。
- ・先行き不透明な部分もあり現在調査中であるが、発注者には工事遅延による価格変動等も含め柔軟な対応をしていただくようお願いしたい。
- ・新年度で新規工事の打合せが始まり、双方が対策を取る必要があるが、マスクなどは依然として購入できていなく不安がある。しかし、円滑化会議など、顔を合わせての打合せが必要となる。
